# 工　期　算　定　表

| 工事区分 / 工種 / 種別 | 細別 | 名称 | 想定日数 |
|---|---|---|---|
| 準備工 | | | |
| | | | 60.0 |
| 建築工事 | | | |
| | | | 90.0 |
| 基盤整備 | | | |
| 敷地造成工 | | | |
| 掘削工 | 掘削 | 公園側 | 15.0 |
| 盛土工 | 路床盛土 | 公園側 | 6.0 |
| 残土処理工 | 土砂等運搬 | 公園側 | 18.0 |
| 擁壁工 | | | |
| 場所内擁壁工 | 小型擁壁 | 荒見苑周辺 | 5.0 |
| | | 公園側 | 13.0 |
| 構造物撤去工 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 荒見苑周辺 | 17.0 |
| | | 公園側 | 14.0 |
| ブロック舗装撤去工 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ILB舗装撤去　（公園側） | 2.0 |
| 縁石撤去工 | | 公園側 | 3.0 |
| 公園施設撤去・移設工 | | | |
| 公園施設撤去工 | 公園施設撤去 | 荒見苑周辺 | 1.0 |
| | | 公園側 | 25.0 |
| | 給水設備撤去 | 荒見苑周辺 | 1.0 |
| | | 公園側 | 2.0 |
| | 排水設備撤去 | 公園側 | 4.0 |
| | 電気設備撤去 | 荒見苑周辺 | 4.0 |
| | | 公園側 | 24.0 |
| | | キュービクル周辺 | 8.0 |
| 樹木伐採・伐根工 | 高木伐採・伐根 | 荒見苑周辺 | 8.4 |
| | | 公園側 | 10.1 |
| | 中低木伐採・伐根 | 荒見苑周辺 | 22.5 |
| | | 公園側 | 16.0 |
| 植栽 | | | |
| 植栽工 | | | |
| 高木植栽工 | 高木植栽 | 公園側 | 3.0 |
| 中低木植栽工 | 中低木植栽 | 公園側 | 2.0 |
| 地被類植栽工 | 地被類植栽 | 公園側 | 1.0 |
| | 張芝 | コウライシバ　（公園側） | 8.0 |
| 施設整備工 | | | |
| 給水設備工 | | | |
| 水栓類取付工 | 止水栓 | 公園側 | 2.0 |
| 散水施設工 | 散水栓 | 散水栓（上水用）　公園側 | 2.0 |
| 給水管路工 | 給水管 | 公園側 | 7.0 |
| 水栓類取付工 | 仕切弁 | 公園側（ポンプ周辺） | 1.0 |
| 散水施設工 | 散水栓 | 公園側（ポンプ周辺） | 11.0 |
| 給水管路工 | 給水管 | 公園側（ポンプ周辺） | 13.0 |
| 雨水排水設備工 | | | |
| 側溝工 | | 公園側 | 8.0 |
| 管渠工 | | 公園側 | 4.0 |
| 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 | ﾏﾝﾎｰﾙ | 雨水集水マンホール | 20.0 |
| | | 1 号ﾏﾝﾎｰﾙ-1 | 20.0 |
| | | 公園側その他マンホール | 6.0 |
| | 集水桝 | 公園側 | 16.0 |
| 電気設備工 | | | |
| 照明設備工 | ハンドホール | 公園側 | 3.0 |
| | 高圧受変電設備 | 新高圧受電盤 | 14.0 |
| | 分電盤 | 電灯制御盤 | 1.0 |
| | | 動力制御盤（ポンプ） | 1.0 |
| | | コンセント（公園側） | 4.0 |
| | 照明灯 | 公園側 | 12.0 |
| 電線管路工 | 電線 | キュービクル周辺 | 16.0 |
| | | 公園側 | 83.0 |
| 園路広場整備工 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工 | 公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 公園側 | 1.0 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 | 公園側 | 8.0 |
| | 公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 公園側 | 25.0 |
| 樹脂系舗装工 | 樹脂舗装 | 人工芝舗装-1 | 2.0 |
| 石材系舗装工 | 砂利舗装 | 公園側 | 2.0 |
| | 平石張舗装 | 石舗装 | 1.0 |
| 園路縁石工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 歩車道境界縁石 | 4.0 |
| 区画線工 | ペイント式区画線 | 駐車場ペイント | 1.0 |
| 階段工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 | 公園側 | 10.0 |
| | スロープ | 公園側 | 9.0 |
| 修景施設整備工 | | | |
| 石組工 | 景石 | 公園側 | 3.0 |
| ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工 | ﾓﾆｭﾒﾝﾄ | マウンテン-1 | 14.0 |
| | | マウンテン-2 | 14.0 |
| 水景施設工 | 吐出口 | 噴水 | 2.4 |
| | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 噴水ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 1.0 |
| 遊戯施設整備工 | | | |
| 遊具組立設置工 | 遊具 | 複合遊具 | 7.0 |
| | | 幼児用遊具-1 | 2.0 |
| | | 幼児用遊具-2 | 2.1 |
| 小規模現場打遊具工 | 砂場 | 砂場 | 1.5 |
| サービス施設整備工 | | | |
| ベンチ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 | ベンチ | 公園側 | 30.0 |
| サイン施設工 | サイン | 公園側 | 4.0 |
| 管理施設工 | | | |
| 柵工 | ﾌｪﾝｽ・門扉 | 公園側 | 4.0 |
| | 手すり | 公園側 | 14.0 |
| 車止め工 | 車止め | 公園側 | 9.0 |
| 建築施設組立設置工 | | | |
| 四阿工 | 四阿基礎 | 仮設タープ基礎 | 4.0 |
| 自転車置場工 | 自転車置場設置 | 屋根付駐輪場 | 3.0 |

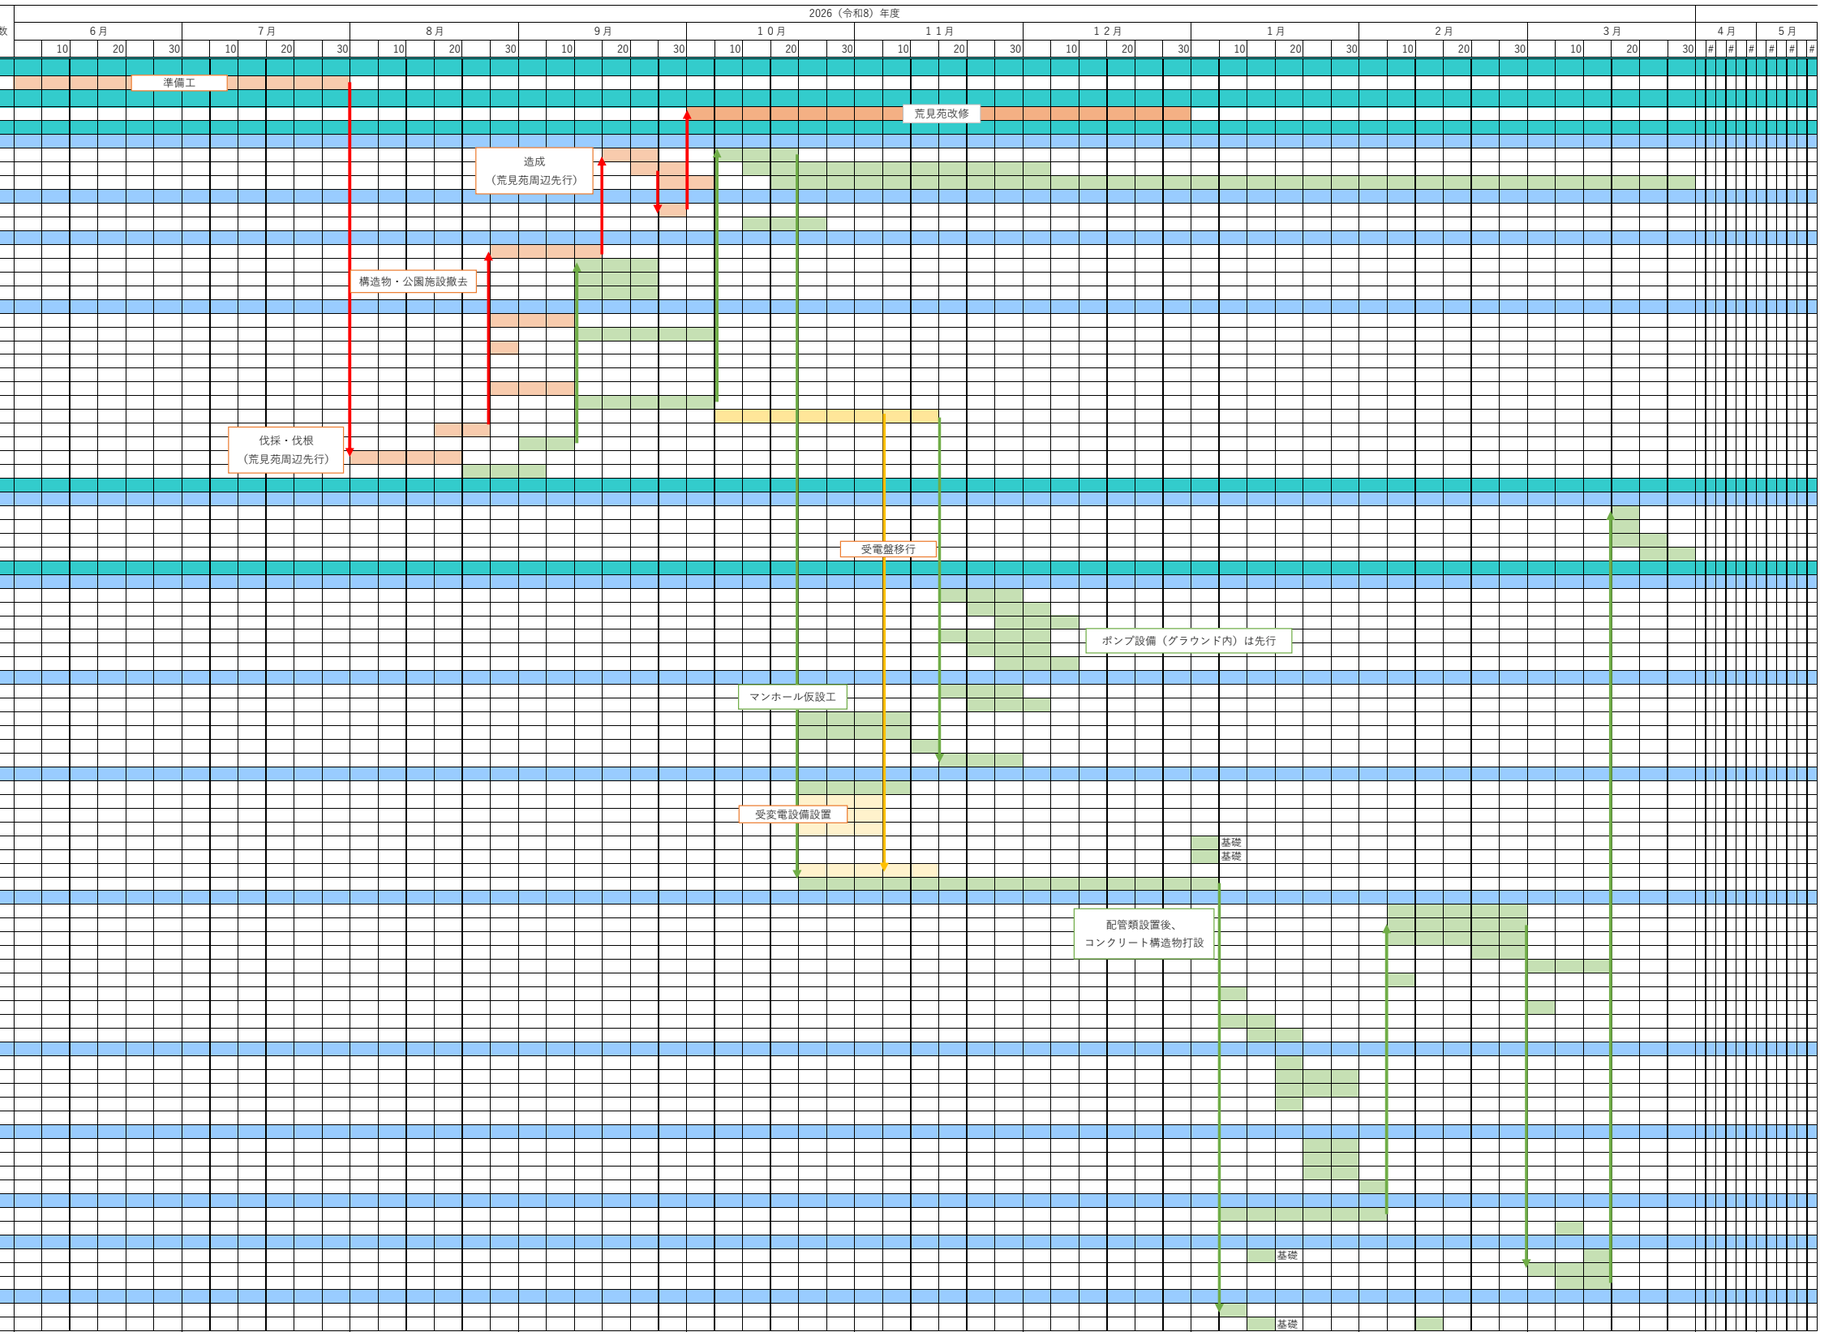

# 工　期　算　定　表

| 工事区分 / 工種 / 種別 | 細別 | 名称 | 想定日数 |
|---|---|---|---|
| 基盤整備 | | | |
| 敷地造成工 | | | |
| 掘削工 | 掘削 | グラウンド側 | 6.0 |
| 盛土工 | 路床盛土 | グラウンド側 | 3.0 |
| 残土処理工 | 土砂等運搬 | グラウンド側 | 18.0 |
| 擁壁工 | | | |
| 場所内擁壁工 | 小型擁壁 | グラウンド側 | 13.0 |
| 構造物撤去工 | | | |
| 標識撤去工 | 標識撤去 | 標識撤去 | 1.0 |
| | | 区画線消去 | 1.0 |
| 構造物取壊し工 | 舗装版破砕 | グラウンド側 | 9.0 |
| ブロック舗装撤去工 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ILB舗装撤去　（グラウンド側） | 4.0 |
| 縁石撤去工 | | グラウンド側 | 2.0 |
| 公園施設撤去・移設工 | | | |
| 公園施設撤去工 | 公園施設撤去 | グラウンド側 | 25.0 |
| | 排水設備撤去 | グラウンド側 | 9.0 |
| | 電気設備撤去 | グラウンド側 | 3.0 |
| 植栽 | | | |
| 植栽工 | | | |
| 高木植栽工 | 高木植栽 | グラウンド側 | 3.0 |
| 中低木植栽工 | 中低木植栽 | グラウンド側 | 1.0 |
| 地被類植栽工 | 張芝 | コウライシバ　（グラウンド側） | 8.0 |
| 施設整備工 | | | |
| 標識工 | | | |
| 小型標識工 | 標識柱 | 標識 | 1.0 |
| 区画線工 | | | |
| 区画線工 | 溶融式区画線 | T-ペイント | 1.0 |
| 給水設備工 | | | |
| 水栓類取付工 | 止水栓 | グラウンド側 | 3.0 |
| 散水施設工 | 散水栓 | 散水栓（上水用）　グラウンド側 | 3.0 |
| 消火栓工 | 消火栓高さ調整 | 消火栓ボックス嵩上げ | 2.0 |
| 給水管路工 | 給水管 | グラウンド側 | 5.0 |
| 給水設備工(雨水利用) | | | |
| 水栓類取付工 | 仕切弁 | グラウンド側 | 3.0 |
| 散水施設工 | 散水栓 | グラウンド側 | 2.0 |
| 給水管路工 | 給水管 | グラウンド側 | 2.0 |
| 雨水排水設備工 | | | |
| 側溝工 | | グラウンド側 | 8.0 |
| 管渠工 | | グラウンド側 | 4.0 |
| 集水桝・マンホール工 | 集水桝 | グラウンド側 | 16.0 |
| 電気設備工 | | | |
| 照明設備工 | ハンドホール | グラウンド側 | 2.0 |
| | 分電盤 | コンセント（グラウンド側） | 4.0 |
| | 照明灯 | グラウンド側 | 12.0 |
| 電線管路工 | 電線 | グラウンド側 | 83.0 |
| 園路広場整備工 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工 | 公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | グラウンド側 | 25.0 |
| 石材系舗装工 | 砂利舗装 | グラウンド側 | 2.0 |
| | 小舗石舗装 | 小舗石舗装 | 1.0 |
| 園路縁石工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 地先境界縁石 | 3.0 |
| 階段工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 | グラウンド側 | 6.0 |
| 修景施設整備工 | | | |
| 石組工 | 景石 | グラウンド側 | 3.0 |
| ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工 | 記念碑 | 記念碑移設 | 1.0 |
| サービス施設整備工 | | | |
| 洗い場工 | 手洗い場 | 立水栓 | 1.0 |
| ベンチ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 | ベンチ | グラウンド側 | 15.0 |
| サイン施設工 | サイン | グラウンド側 | 4.0 |
| 管理施設工 | | | |
| 柵工 | ﾌｪﾝｽ・門扉 | グラウンド側 | 16.0 |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備 | | | |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工 | | | |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ用舗装工 | 人工芝舗装 | 人工芝舗装-2 | 30.0 |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工 | | | |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工 | 防球ネット | グラウンド側 | 25.0 |
| | 防球ネット | 防球ネット下部追加-1 | 10 |
| | | 防球ネット下部追加-2 | 11.5 |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設修繕工 | ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設修繕 | ダッグアウト改修 | 2.0 |
| | | バックネット再塗装 | 1.0 |

※着手時期については、グラウンドの沈下状況の確認結果により、前後します。
